



MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: **MUNICÍPIO DE VICENTINA**

Local: **VICENTINA - MS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

Obra 2: Duas estruturas medindo 30.00x50.00/7.00m (platibanda).

Uma estrutura de concreto armado pré-fabricado e metálico com área construída de 1.500,00m² e as seguintes características:

- 1) Dimensões:
01 Barracão medindo: 30.00m de largura, 50.00m de comprimento e 7.00m de altura com vãos de 6.25m entre os pórticos e um mezanino no oitão medindo 30.00m de largura por 6.25m de comprimento.
- 2) Fundações:
Execução de 33 blocos de concreto armado (80x140x140cm) e perfuradas duas broca de Ø 25cm com profundidade de 6m para cada bloco.
- 3) Estrutura em concreto pré-fabricado constituído de:
33 colunas retas (seção de 25x50cm), com resistência característica do concreto de FCK 25 MPa.

160m de viga respaldo e 190m de viga intermediária pré-fabricadas.
- 4) Estrutura da cobertura:
Composta por braços T pré-fabricados, 2 tubos metálicos de 250mm, com duas linhas de agulha ferro redondo de 3/8" em todos os vãos e 20 linhas de terças medindo 127x40x20#14.
- 5) Cobertura:
Cobertura em sanduíche de 0,43mm onda baixa e devida cumeeiras fixadas com conjunto haste Ø1/4" x 85 mm (zincado). Barracão com inclinação de 20%.

Ramon Aiolo de Brito



Orçamento de Estrutura Pré-Fabricada

A/C.:

Estrutura : 30,00 x 50,00 x 7,00
: Mezanino no oitão 5,00x30,00x3,50
: Cobertura com telha sanduiche EPS de 30mm

Proprietário : MUNICIPIO DE VICENTINA
Endereço : VICENTINA-MS
Fone/Fax :
Cnpj/Cpf :
Email :
Data : 05/08/2020

Seção : 25 x 50 (Super-Grande)
Contrato : 05/08/2020
Vendedor :
Pedido :
Prazo : 75
Entrega : 19/10/2020

DIMENSOES DA OBRA			
Quant.	Unid.	Especificação	
30,00	m	Largura da estrutura	
-	m	Beiral lateral direito	
-	m	Beiral lateral esquerdo	
50,00	m	Comprimento da estrutura	
-	m	Beiral longitudinal frente	
-	m	Beiral longitudinal fundos	
7,00	m	Pé direito	
9,00	un	Pórticos	
6,22	m	Espaçamento entre Pórticos	
60,00	m	Viga inter p/ receber laje	
130,00	m	Vigas Intermediárias	
160,00	m	Vigas Respaldo	
19,00	un	Pilar pré fabricado para oitão e mezanino	

seção: pilar Super-Grande ▼
braço Super-Grande ▼
Aço Galvanizado Trapézio ▼
telha: Onda baixa ▼
0,43mm ▼
terça: Aço ▼

CONCRETO					
Contr.	Quant.	Unid.	Especificação	C. Unit.	C. Tot.
	19,25	m³	14 Pilar 25x50x11,00	2.100,00	40.425,00
	16,63	m³	14 Pilar 25x50x8,50 + 2,50 platibanda	2.100,00	34.912,50
	70,00	m	Tubo de 150	80,00	5.600,00
	16,10	m³	14 Braço 25x50 - T comp. 15,30mts	2.200,00	35.420,00
	33,00	un	Bloco de fundação c/ estaca	1.258,27	41.523,04
				Soma =	157.880,54

VIGAMENTO					
Contr.	Quant.	Unid.	Especificação	C. Unit.	C. Tot.
	60,00	m	Viga inter p/ receber laje	148,50	8.910,00
	130,00	m	Vigas Intermediárias	105,60	13.728,00
	160,00	m	Vigas Respaldo	132,00	21.120,00
	5,00	un	Pilar 0,25x0,40x5,00	808,50	4.042,50
	1,00	un	Mão de obra	7.170,08	7.170,08
	45,00	un	sikadur	40,00	1.800,00
				Soma =	56.770,58

COBERTURA					
Contr.	Quant.	Unid.	Especificação	C. Unit.	C. Tot.
	1.000,00	m	Terça de 127 chapa 14	28,00	28.000,00
	1.530,00	m	Telha Sanduiche TR25 chapa 0,43mm EPS de 30mm	72,00	110.160,00
	50,00	un	Cumeeira de Aço Galvanizado Trapézio # 0,43mm	28,00	1.400,00
	3.180,00	un	Ganchos 8,5 cm	1,00	3.180,00
	900,00	un	Eletrodos	1,00	900,00
				Soma =	143.640,00

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, GABARITO DE OBRA E PLACA DE OBRA					
Contr.	Quant.	Unid.	Especificação	C. Unit.	C. Tot.
				Soma =	18.645,00


Renan Aida de Brito

OUTROS					
Contr.	Quant.	Unid.	Especificação	C. Unit.	C. Tot.
	100,00	m	Calha com fundo de 30cm	80,00	8.000,00
				Soma =	8.000,00

MAO-DE-OBRA					
Contr.	Quant.	Unid.	Especificação	C. Unit.	C. Tot.
	1.500,00	m ²	Mão de Obra Montagem	42,00	63.000,00
				Soma =	63.000,00

Estrutura e cobertura 30,00x50,00x6,50	391.165,54
Vigamento pré-moldado	56.770,58
Total do orçamento	447.936,12


Ruan Audo de Dito

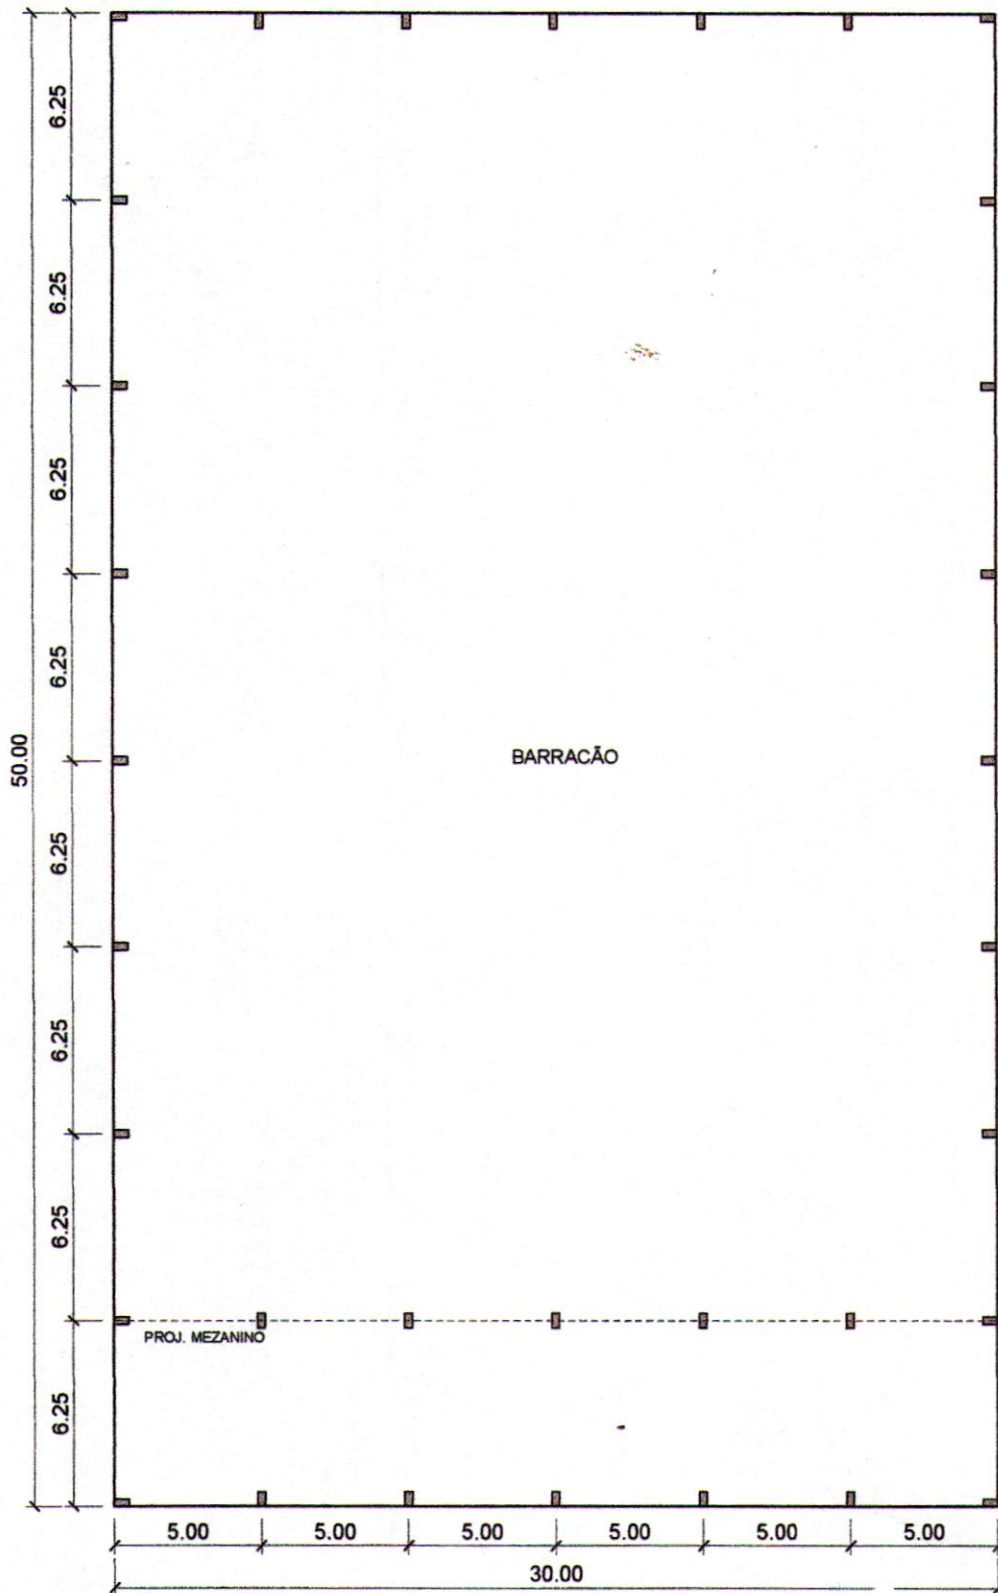


Renan Aides de Brito



-	-	-	-	-	PRANCHA
0	A	EMIÇÃO_INICIAL	CFG	04/08/2020	PLANTA BAIXA
REV.	T.E	DESCRIÇÃO	DES.	DATA	-
TIPO DE EMISSÃO (T.E)		(A) PARA ORÇAMENTO	(B) PARA FABRICAÇÃO	-	
CLIENTE MUNICÍPIO DE VICENTINA			LOCAL VICENTINA / MS		
REFERENTE OBRA 2 e 3 - BAR. 30.00x50.00/7.00m				ESCALA SEM ESCALA	FOLHA 01/03

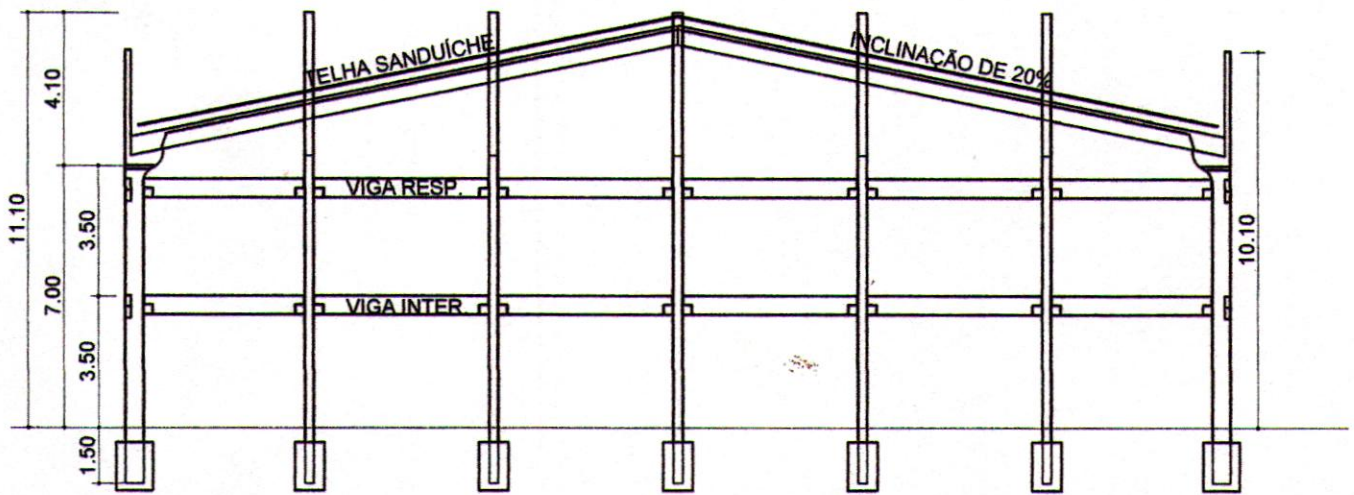

CORTE

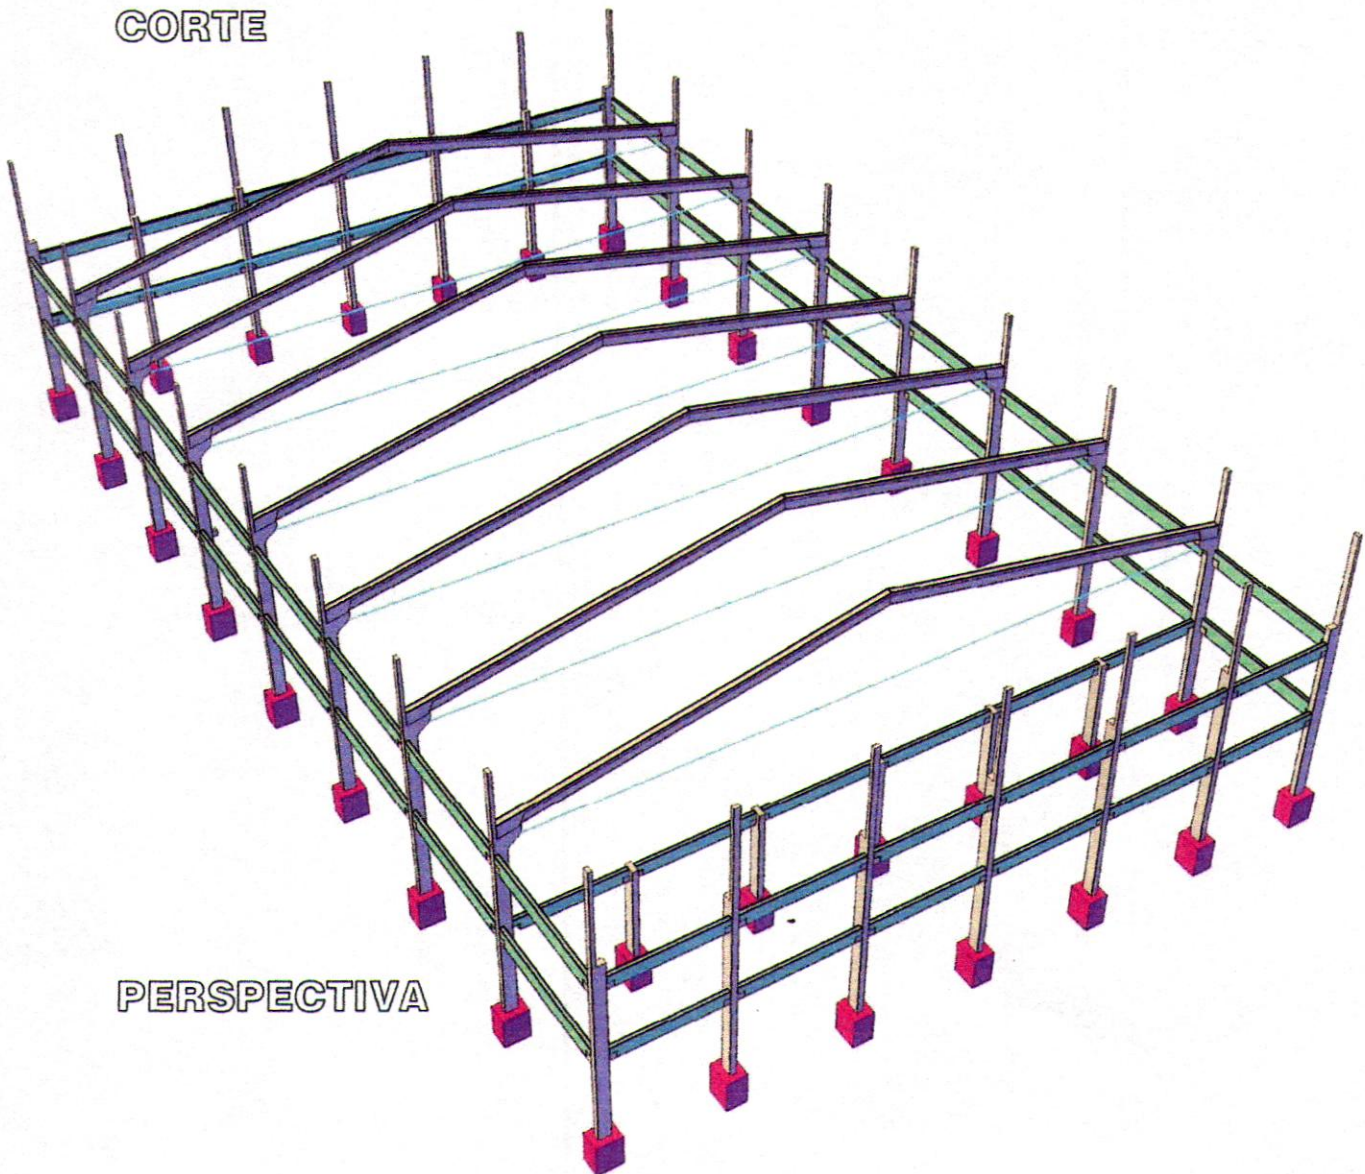


PERSPECTIVA


Ron Aida de Brito




-	-	-	-	-	-	PRANCHA
0	A	EMIÇÃO_INICIAL	CFG	04/08/2020		CORTE
REV.	T.E	DESCRIÇÃO	DES.	DATA		PERSPECTIVA
TIPO DE EMISSÃO (T.E)		(A) PARA ORÇAMENTO	(B) PARA FABRICAÇÃO			-
CLIENTE			LOCAL			
MUNICÍPIO DE VICENTINA			VICENTINA / MS			
REFERENTE				ESCALA	FOLHA	
OBRA 2 e 3 - BAR. 30.00x50.00/7.00m				SEM ESCALA	02/03	
-	-	-	-	-	-	

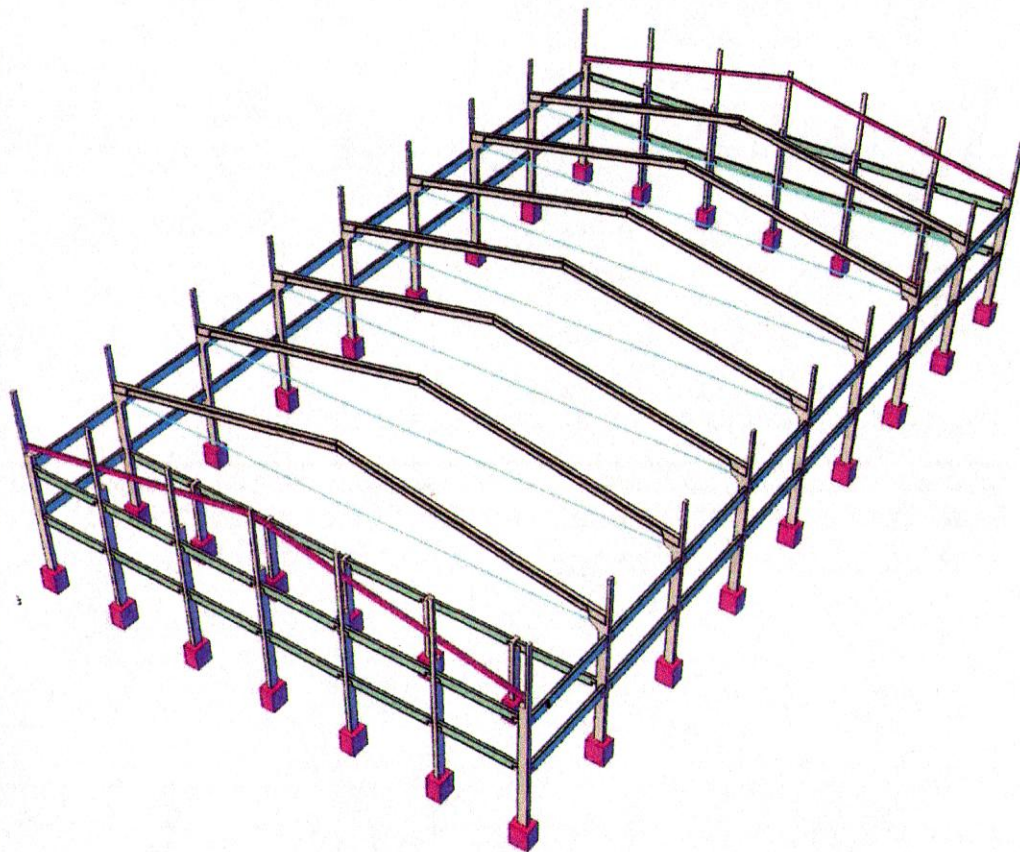

PERSPECTIVA I

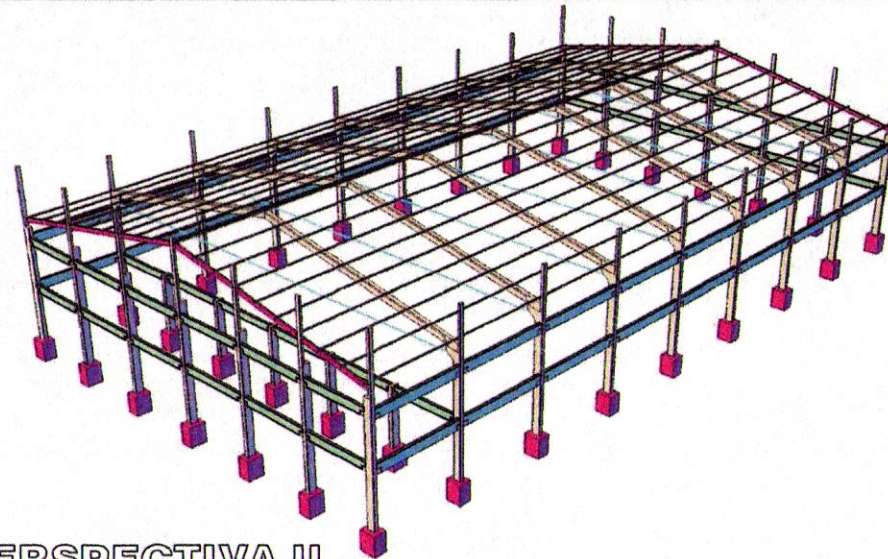

PERSPECTIVA II

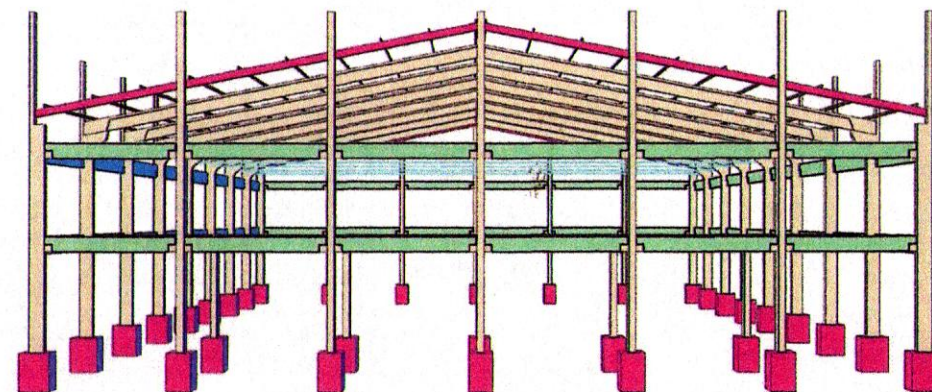

PERSPECTIVA III



-	-	-	-	-	-	PRANCHA	
0	A	EMIÇÃO_INICIAL	CFG	04/08/2020	PERSPECTIVA I		
REV.	T.E	DESCRIÇÃO	DES.	DATA	PERSPECTIVA II		
TIPO DE EMISSÃO (T.E)		(A) PARA ORÇAMENTO	(B) PARA FABRICAÇÃO	PERSPECTIVA III			
CLIENTE				LOCAL			
MUNICIPIO DE VICENTINA				VICENTINA / MS			
REFERENTE				ESCALA		FOLHA	
OBRA 2 e 3 - BAR. 30.00x50.00/7.00m				SEM ESCALA		03/03	
-							

Ramon Aida de Brito
